

Team-plan-v1.0 HealthCare

Team-plan-v1.0: HealthCare

• Σύνθεση της ομάδας:

ο Φοίβος Αλλαγιώτης Α.Μ.: 1056636, 4° έτος

ο Αντρέας Παλαμάς Α.Μ.: 1049789 4° έτος

ο Ορέστης Παρεκκλησίτης Α.Μ.: 1056646 4° έτος

ο Ηλίας Καρύδης Α.Μ.: 1056921 5° έτος

• Ρόλοι Ομάδας:

ο Editor: Αντρέας Παλαμάς

Contributor: Ορέστης ΠαρεκκλησίτηςPeer reviewer: Φοίβος Αλλαγιώτης

Peer reviewer: Ηλίας Καρύδης


Χρονοπρογραμματισμός:Πίνακας Υποέργων:

Τυπικά Υποέργα (Tasks)	Προαπαιτούμενα Υποέργα	Αισιόδοξη εκτίμηση	Κανονική Εκτίμηση	Απαισιόδοξη εκτίμηση
TY1 - Αρχική περιγραφή ιδέας (Project Description)	-	4 Ημέρες	6 Ημέρες	8 Ημέρες
TY2 - Χρονοπρογραμματισμός και κόστος υλοποίησης (Project Plan)	TY1	7 Ημέρες	8 Ημέρες	11 Ημέρες
ΤΥ3 - Παρουσίαση τυχών κινδύνων που μπορούν να προκύψουν (Risk Assessment)	TY1	5 Ημέρες	7 Ημέρες	10 Ημέρες
ΤΥ4 - Παράθεση των δυνατών ενεργειών ενός πιθανού χρήστη(Use cases)	TY1	7 Ημέρες	10 Ημέρες	12 Ημέρες
TY5 - Αρχικός σχεδιασμός κλάσεων (Domain model)	TY1, TY4	8 Ημέρες	9 Ημέρες	13 Ημέρες
TY6 - Σχεδιασμός διαγραμμάτων ευρωστίας (Robustness diagrams)	TY4	5 Ημέρες	6 Ημέρες	9 Ημέρες
ΤΥ7 - Συγγραφή κώδικα για τα βασικά στοιχεία διεπαφής του χρήστη (Project Code)	TY5, TY6	9 Ημέρες	10 Ημέρες	14 Ημέρες
TY8 - Σχεδιασμός διαγραμμάτων ακολουθίας (Sequence Diagrams)	TY6	8 Ημέρες	10 Ημέρες	12 Ημέρες
TY9 - Τελικός σχεδιασμός διαγράμματος κλάσεων (Class Diagrams)	TY5	9 Ημέρες	10 Ημέρες	12 Ημέρες
TY10 - Ολοκλήρωση και έλεγχος κώδικα	TY7	20 Ημέρες	24 Ημέρες	30 Ημέρες
ΤΥ11 - Ανασκόπηση προηγούμενων παραδοτέων και παράδοση τελικών εκδόσεων	TY6, TY8, TY9	9 Ημέρες	10 Ημέρες	15 Ημέρες

ο Διαγράμματα Pert και Gantt:


Πιο κάτω παραθέτουμε τα διαγράμματα έργου Gantt chart και Pert chart με ημερομηνία έναρξης 27 Φεβρουαρίου του 2021. Για την υλοποίηση αυτών των διαγραμμάτων χρησιμοποιήσαμε το online εργαλείο draw io. Κάθε κουτί του Pert chart περιέχει την ονομασία του τυπικού υποέργου τον αριθμό του υποέργου τη διάρκεια του υποέργου σε μέρες, την ημερομηνία έναρξης του και την ημερομηνία λήξης του. Στην διάρκεια του κάθε υποέργου βάλαμε την κανονική εκτίμηση του κάθε τυπικού υποέργου. Επιπλέον στην υλοποίηση αυτών των δύο διαγραμμάτων, θεωρήσαμε ότι η ομάδα μας θα δουλεύει από τη Δευτέρα μέχρι το Σάββατο εκτός Κυριακή και αργίες. Επίσης λήφθηκαν υπόψη και οι διακοπές του Πάσχα.

Pert:

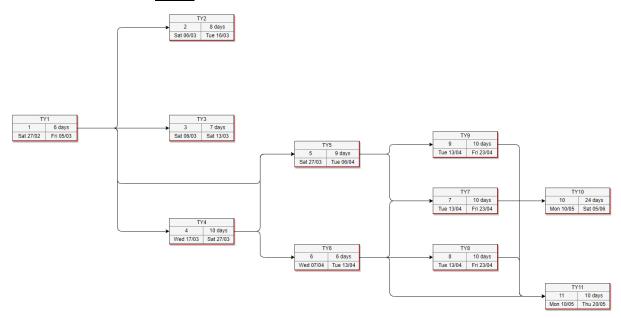

Διάγραμμα 1: Pert Chart

Gantt:



Διάγραμμα 2: Gantt Chart

• Περιγραφή μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν:

Η μέθοδος που θα εργαστούμε ως ομάδα είναι το SCRUM.
Λόγω των συνθηκών που διανύουμε τα meetings μας είναι προγραμματισμένα να γίνονται 2-3 φορές την βδομάδα μέσω Skype.

• Βασικά εργαλεία:

Για τα Gantt και Pert Charts δουλέψαμε με το online tool draw.io. Όσο αφορά τα τεχνικά κείμενα χρησιμοποιήσαμε την Word. Για την δημιουργία mock-up screens χρησιμοποιήθηκε το moqups. Η ανάπτυξη της εφαρμογής θα γίνει χρησιμοποιώντας την Java. Το code editor που θα χρησιμοποιήσουμε είναι το Netbeans και ο συνολικός κώδικας θα είναι αποθηκευμένος στο git repository όπου κάθε μέλος θα μπορεί να κάνει pull και push μέσω του code editor.
